

23.12.2024

Der Busverkehr auf den Linien X491, X492, 430, 440 und N4 wird am 23. Dezember 2024 auf den „regulären Fahrplan“ umgestellt.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Hasbergen im Bereich der „Tecklenburger Str. – K305“ wird im Dezember wieder für den Verkehr freigegeben.

Somit stellen wir den Busverkehr in der Gemeinde Hasbergen wieder auf den „Normal“ Fahrplan um.

Nähere Informationen finden Sie [hier. Bitte anklicken.](#)

27.11.2024

Bürgerinformation zum zweiten Teil des Ausbaus der Ortsdurchfahrt in Hasbergen (K305)

Der nächste Bauabschnitt in der Ortsdurchfahrt von Hasbergen (K305, Tecklenburger Straße) wird ab Anfang 2025 realisiert. Betroffen ist der Abschnitt von der Schulstraße bis zum Hüggelzweggekreisel. In diesem Bereich wird neben der eigentlichen Fahrbahn zeitgleich der Regenkanal und teilweise auch der Schmutzwasserkanal erneuert. Zu den Arbeiten gehört auch die Neuverlegung der Trinkwasserleitung. Dazu werden nahezu alle weiteren Versorgungsleitungen angepasst oder sogar neu verlegt.

[Bürgerinfo zur Baumaßnahme K305](#)

07.05.2024

Ortsdurchfahrt Hasbergen: Fertigstellung verzögert sich aufgrund der Niederschläge

Aufgrund der anhaltenden ungewöhnlich hohen Niederschläge in den vergangenen Monaten verzögert sich die Fertigstellung der Ortsdurchfahrt Hasbergen weiter. Nachdem die Bauarbeiten schon von Oktober bis Mitte März an der K305 stagnierten, konnten sie auch im März und Anfang April aufgrund der enormen Niederschläge nicht im geplanten Umfang weitergeführt werden.

Zwar hat es in den vergangenen Tagen weniger Regen gegeben. Der Baugrund ist allerdings so stark wassergesättigt, dass es zu anhaltenden Problemen im Bereich des Kanalbaus kommt. So ist es unter anderem notwendig, in der gesamten Baustrecke eine aufwändige Wasserhaltung zu installieren, um den Kanal und weitere Versorgungsleitungen überhaupt erneuern zu können.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Versorgungsleitungen vorgefunden, deren Lage mit dem neu zu verlegenden Regenkanal kollidiert. Hier müssen mehr Anpassungen vorgenommen werden als im Vorfeld abzusehen war. Dies kann nur taktweise und im Wechsel mit dem Kanalbau erfolgen, da Abhängigkeiten in der Trassenführung bestehen.

Dies führt dazu, dass die Arbeiten des ersten Bauabschnitts vom Kreisverkehr am Naturbad bis zur Schulstraße erst gegen Jahresende 2024 abgeschlossen werden können.



03.04.2024

Umleitungsstrecke Fußgänger und Radfahrer



15.03.2024

Ortsdurchfahrt Hasbergen: Strecke von „Am Hübel“ bis „Kreilkauer Weg“ vollgesperrt


Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Hasbergen sind zu Beginn der Woche wieder aufgenommen worden. Dafür wurde erneut eine Vollsperrung eingerichtet. Anders als im

vergangenen Jahr ist nun die Strecke von „Am Hüvel“ bis „Krelkauer Weg“ vollgesperrt. Anlieger erreichen den Bereich „Am Hüvel“ aus Gaste und Leeden kommend über den Kreisverkehr Hauptstraße/Tecklenburgerstraße und über die Umleitungsstrecke Hagen.

Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt werden voraussichtlich bis zum Spätsommer dauern. Der zweite Abschnitt der Ortdurchfahrt von der Schulstraße bis zum Kreisverkehrsplatz „Hüggelzwerge“ wird dann im Anschluss erneuert.

06.03.2024

Pressemitteilung Ortdurchfahrt Hasbergen

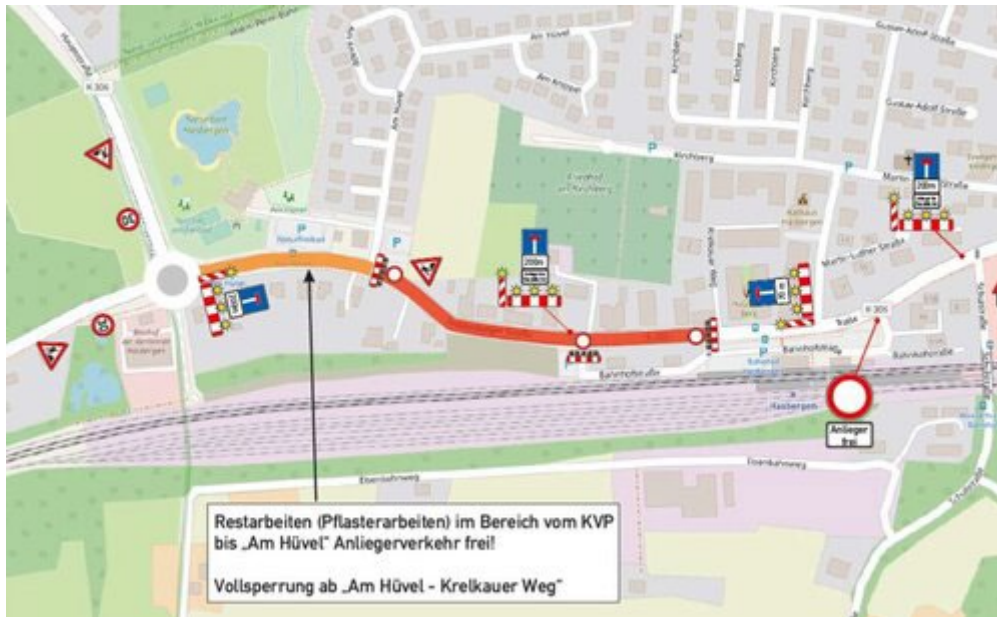

05.03.2024

Zu Beginn der kommenden Woche (11. März) werden die Arbeiten in der Ortdurchfahrt Hasbergen wieder aufgenommen. Dafür muss die Strecke erneut gesperrt werden. Grund für die Unterbrechung der Arbeiten waren die anhaltend schlechten Wetterbedingungen.

Die Umleitungsstrecke wird, wie im vergangenen Jahr, über Hagen geführt. Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt werden voraussichtlich bis zum Spätsommer dauern. Der zweite Abschnitt der Ortdurchfahrt von der Schulstraße bis zum Kreisverkehrsplatz „Hüggelzwerge“ wird dann im Anschluss erneuert.

Der Landkreis Osnabrück bittet um Verständnis und um besondere Rücksichtnahme im Bereich der Baustelle und der Umleitungsstrecke.

